COMUNE:
GANDINO
Provincia di Bergamo

PROTOCOLLO:

COMMITTENTE:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GANDINO
P.zza V. VENETO, 7 - 24024 GANDINO (BG)

L1

DENOMINAZIONE:

REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE TRATTO DI COMPETENZA DI GANDINO, A COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DELLE CINQUE TERRE DELLA VAL GANDINO

LOTTO 1

CUP: *I41B23000170009*

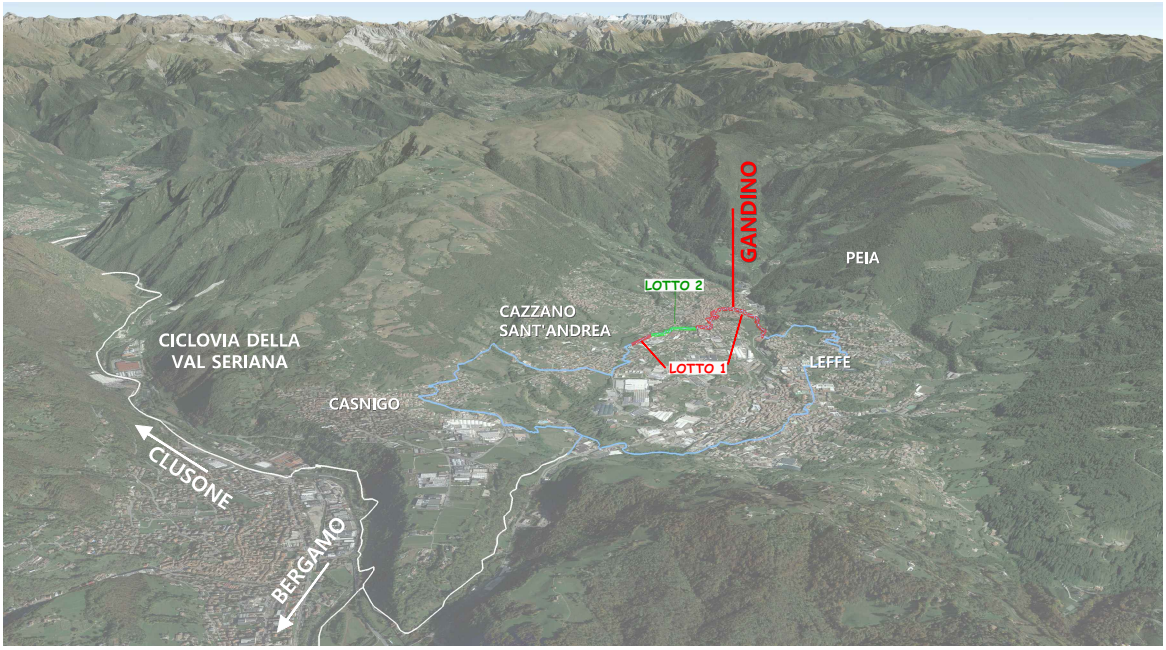

FASE: **PROGETTO ESECUTIVO**

OGGETTO: **CRONOPROGRAMMA**

ELABORATO:
ALLEGATO 05.C

EMISSIONE: DATA: NOVEMBRE 2025

REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE REVISIONE:

CODICE PROGETTO: E06625

PROGETTO:
studio di architettura elia franchina
24024 Gandino (BG) - Vicolo Franchina, 3
Cell. 339 4880222
Mail elia.architetto@efstudio.it
PEC elia.franchina@archiworldpec.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Geometra Francesco Carrara
P.zza V. veneto, 7 - 24024 Gandino (BG)
Tel. +39 035 745567
Fax +39 035 745646
Mail info@comune.gandino.bg.it
PEC comune.gandino@legalmail.it

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Arch. Elia Franchina

RILIEVO TOPOGRAFICO:
Arch.jr Giuliano Imberti

GEOLOGO:
Castalia - Studio Associato di Geologia

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:

PROGETTISTA STRUTTURE:

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

ALLEGATO "C"

Comune di Gandino Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANT

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione del percorso ciclopedonale, tratto di competenza di Gandino, a completamento del **Percorso** ciclopedonale delle cinque terre della val Gandino

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Gandino

CANTIERE: Comune di Gandino (BG)

Gandino, novembre 2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____
(Architetto Elia Franchina)

per presa visione
IL Responsabile Unico del Procedimento

_____
(Geom. Francesco Carrara)

Architetto Elia Franchina

Vicolo Franchina, 3 - 24024 Gandino (BG) - Cell.: 339 4880222 - E-mail: elia.architetto@efstudio.it

REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE, TRATTO DI COMPETENZA DI GANDINO, A COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DELLE CINQUE TERRE DELLA VAL GANDINO

LOTTO 1 - TRATTO GA01 e da TRATTI DA GA-B a GA07

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1				
2	**PERIODO COMPLESSIVO PER REALIZZAZIONE LAVORI (NATURALI CONSECUTIVI)**	210 g	mar 16/12/25	lun 13/07/26
3				
4	**LOTTO 1 - TRATTO GA01 e da TRATTO GA-B a GA07**	210 g	mar 16/12/25	lun 13/07/26
5				
6	**FASE 0 - ALLESTIMENTO CANTIERE FASE DA RIPETERE**	5 g	mar 16/12/25	sab 20/12/25
7	SF.0.1 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	mar 16/12/25	gio 18/12/25
8	SF.0.2 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2 g	ven 19/12/25	sab 20/12/25
9	SF.0.3 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	ven 19/12/25	sab 20/12/25
10	SF.0.4 - Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g	ven 19/12/25	sab 20/12/25
11				
12	**FASE 1 - TRATTO GA01 - (Ambito Scuole medie)**	30 g	dom 21/12/25	lun 19/01/26
13	SF.1.1 – Demolizione cordoli esistenti	4 g	dom 21/12/25	mer 24/12/25
14	SF.1.2 – Scavo in sezione ristretta	4 g	gio 25/12/25	dom 28/12/25
15	SF.1.3 – Posa di plinti - pozzetti per pali P.I.	2 g	lun 29/12/25	mar 30/12/25
16	SF.1.4 – Posa di corrugato per realizzare la pubblica illuminazione	3 g	mer 31/12/25	ven 02/01/26
17	SF.1.5 – Scarifica di tappetino	3 g	sab 03/01/26	lun 05/01/26
18	SF.1.6 – Realizzazione di asfaltatura	4 g	mar 06/01/26	ven 09/01/26
19	SF.1.7 – Posa di elementi prefabbricati con funzione di dissuasori	5 g	sab 10/01/26	mer 14/01/26
20	SF.1.8 – Realizzazione di segnaletica stradale verticale	3 g	gio 15/01/26	sab 17/01/26
21	SF.1.9 – Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale	2 g	dom 18/01/26	lun 19/01/26
22				
23	**FASE 3bis - Intervento puntuale GA-B – (Attraversamento via S. Giovanni Bosco)**	15 g	mar 20/01/26	mar 03/02/26
24	SF.3bis.1 – Scarifica di tappetino	3 g	mar 20/01/26	gio 22/01/26
25	SF.3bis.2 – Scarifica di tout venat bitumato	1 g	ven 23/01/26	ven 23/01/26
26	SF.3bis.3 – Realizzazione di dissuasore in calcestruzzo non armato	5 g	sab 24/01/26	mer 28/01/26
27	SF.3bis.4 – Realizzazione di asfaltatura	2 g	gio 29/01/26	ven 30/01/26
28	SF.3bis.5 – Realizzazione di segnaletica stradale verticale	3 g	sab 31/01/26	lun 02/02/26
29	SF.3bis.6 – Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale	1 g	mar 03/02/26	mar 03/02/26
30				
31	**FASE 4 - Tratto GA04 – (Realizzazione di senso unico difronte alle scuole primarie)**	50 g	mer 04/02/26	mer 25/03/26
32	SF.4.1 – Scavo di sbancamento	3 g	mer 04/02/26	ven 06/02/26
33	SF.4.2 – Posa di spreco fognario	3 g	sab 07/02/26	lun 09/02/26
34	SF.4.3 – Posa di caditoie e canalette stradali	3 g	mar 10/02/26	gio 12/02/26
35	SF.4.4 – Demolizione di marciapiedi	3 g	ven 13/02/26	dom 15/02/26
36	SF.4.5 – Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione e elevazione	5 g	lun 16/02/26	ven 20/02/26
37	SF.4.6 – Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione e elevazione	5 g	sab 21/02/26	mer 25/02/26
38	SF.4.7 – Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione e elevazione	5 g	gio 26/02/26	lun 02/03/26
39	SF.4.8 – Realizzazione di sottofondo in stabilizzato e preparazione del piano di posa	3 g	mar 03/03/26	gio 05/03/26
40	SF.4.9 – Posa di cordoli in granito	3 g	ven 06/03/26	dom 08/03/26
41	SF.4.10 – Posa di cornelle o zanelle in cls per divisione corsie	7 g	lun 09/03/26	dom 15/03/26
42	SF.4.11 – Posa di plinti per lame di luce	3 g	lun 16/03/26	mer 18/03/26
43	SF.4.12 – Realizzazione di asfaltatura	3 g	gio 19/03/26	sab 21/03/26
44	SF.4.13 – Realizzazione di segnaletica stradale verticale	3 g	dom 22/03/26	mar 24/03/26
45	SF.4.14 – Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale	1 g	mer 25/03/26	mer 25/03/26
46				
47	**FASE 5 - Tratto GA05 - (Attraversamento Centro Storico)**	15 g	gio 26/03/26	gio 09/04/26
48	SF.5.1 – Posa di dissuasori per segnalare gli ingressi	5 g	gio 26/03/26	lun 30/03/26
49	SF.5.2 – Posa in opera di elementi in plastica di separazione percorso da corsia stradale	4 g	mar 31/03/26	ven 03/04/26
50	SF.5.3 – Realizzazione di segnaletica stradale verticale	4 g	sab 04/04/26	mar 07/04/26
51	SF.5.4 – Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale	2 g	mer 08/04/26	gio 09/04/26
52				
53	**FASE 5bis - Intervento puntuale GA-C - (Attraversamento via Opifici)**	10 g	ven 10/04/26	dom 19/04/26
54	SF.5bis.1 – Posa di dissuasori in metallo	4 g	ven 10/04/26	lun 13/04/26
55	SF.5bis.2 – Realizzazione di segnaletica stradale verticale	3 g	mar 14/04/26	gio 16/04/26
56	SF.5bis.3 – Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale	3 g	ven 17/04/26	dom 19/04/26
57				
58	**FASE 6 - Tratto GA06 – (Via Carducci - Mulattiera di fondo valle)**	60 g	lun 20/04/26	gio 18/06/26
59	SF.6.1 - Decespugliamento e taglio alberi e pulizia rovi	4 g	lun 20/04/26	gio 23/04/26
60	SF.6.2 - Realizzazione di scogliera	5 g	ven 24/04/26	mar 28/04/26
61	SF.6.3 - Sistemazione muro a secco con tecnica del cuci e scuci e canale raccolta acque meteoriche	7 g	mer 29/04/26	mar 05/05/26
62	SF.6.4 - Scavo per realizzazione canali per contenimento eventuali cadute di massi	7 g	mer 06/05/26	mar 12/05/26
63	SF.6.5 - Realizzazione di reti paramassi	7 g	mer 13/05/26	mar 19/05/26
64	SF.6.6 - Scavo di sbancamento	3 g	mer 20/05/26	ven 22/05/26
65	SF.6.7 - Realizzazione di massicciata stradale	3 g	sab 23/05/26	lun 25/05/26
66	SF.6.8 - Realizzazione di sottofondo in stabilizzato e preparazione del piano di posa	4 g	mar 26/05/26	ven 29/05/26
67	SF.6.9 - Ripristino delle canalette esistenti di raccolta acque meteoriche	5 g	sab 30/05/26	mar 03/06/26
68	SF.6.10 - Realizzazione di asfaltatura	3 g	gio 04/06/26	sab 06/06/26
69	SF.6.11 - Formazione di massetto in calcestruzzo per ripristino staccionata esistente	7 g	dom 07/06/26	sab 13/06/26
70	SF.6.12 - Realizzazione di segnaletica stradale verticale	3 g	dom 14/06/26	mar 16/06/26
71	SF.6.13 - Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale	2 g	mer 17/06/26	gio 18/06/26
72				
73	**FASE 6bis - Intervento puntuale GA-D - (Attraversamento via Fondovalle)**	15 g	ven 19/06/26	ven 03/07/26
74	SF.6bis.1 – Scarifica di tappetino	2 g	ven 19/06/26	sab 20/06/26
75	SF.6bis.2 – Scarifica di tout venat bitumato	3 g	dom 21/06/26	mar 23/06/26
76	SF.6bis.3 – Realizzazione di dissuasore in calcestruzzo non armato	3 g	mer 24/06/26	ven 26/06/26
77	SF.6bis.4 – Realizzazione di asfaltatura	4 g	sab 27/06/26	mar 30/06/26
78	SF.6bis.5 – Realizzazione di segnaletica stradale verticale	2 g	mer 01/07/26	gio 02/07/26
79	SF6bis.6 – Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale	1 g	ven 03/07/26	ven 03/07/26
80				
81	**FASE 7 - Tratto GA07 – (Attraversamento a fianco del lanificio Torri)**	5 g	sab 04/07/26	mer 08/07/26
82	SF.7.1 – Realizzazione di segnaletica stradale verticale	3 g	sab 04/07/26	lun 06/07/26
83	SF.7.2 – Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale	2 g	mar 07/07/26	mer 08/07/26
84				
85	**FASE 08 - SMONTAGGIO DEL CANTIERE**	3 g	gio 09/07/26	lun 13/07/26
86	SF.8.1 – Smobilizzo del cantiere	3 g	gio 09/07/26	lun 13/07/26

Data: novembre 2025

Sottofasi lavorative | Lavorazioni principali | Riepilogo manuale | PERIODO COMPLESSIVO DEI LAVORI
